


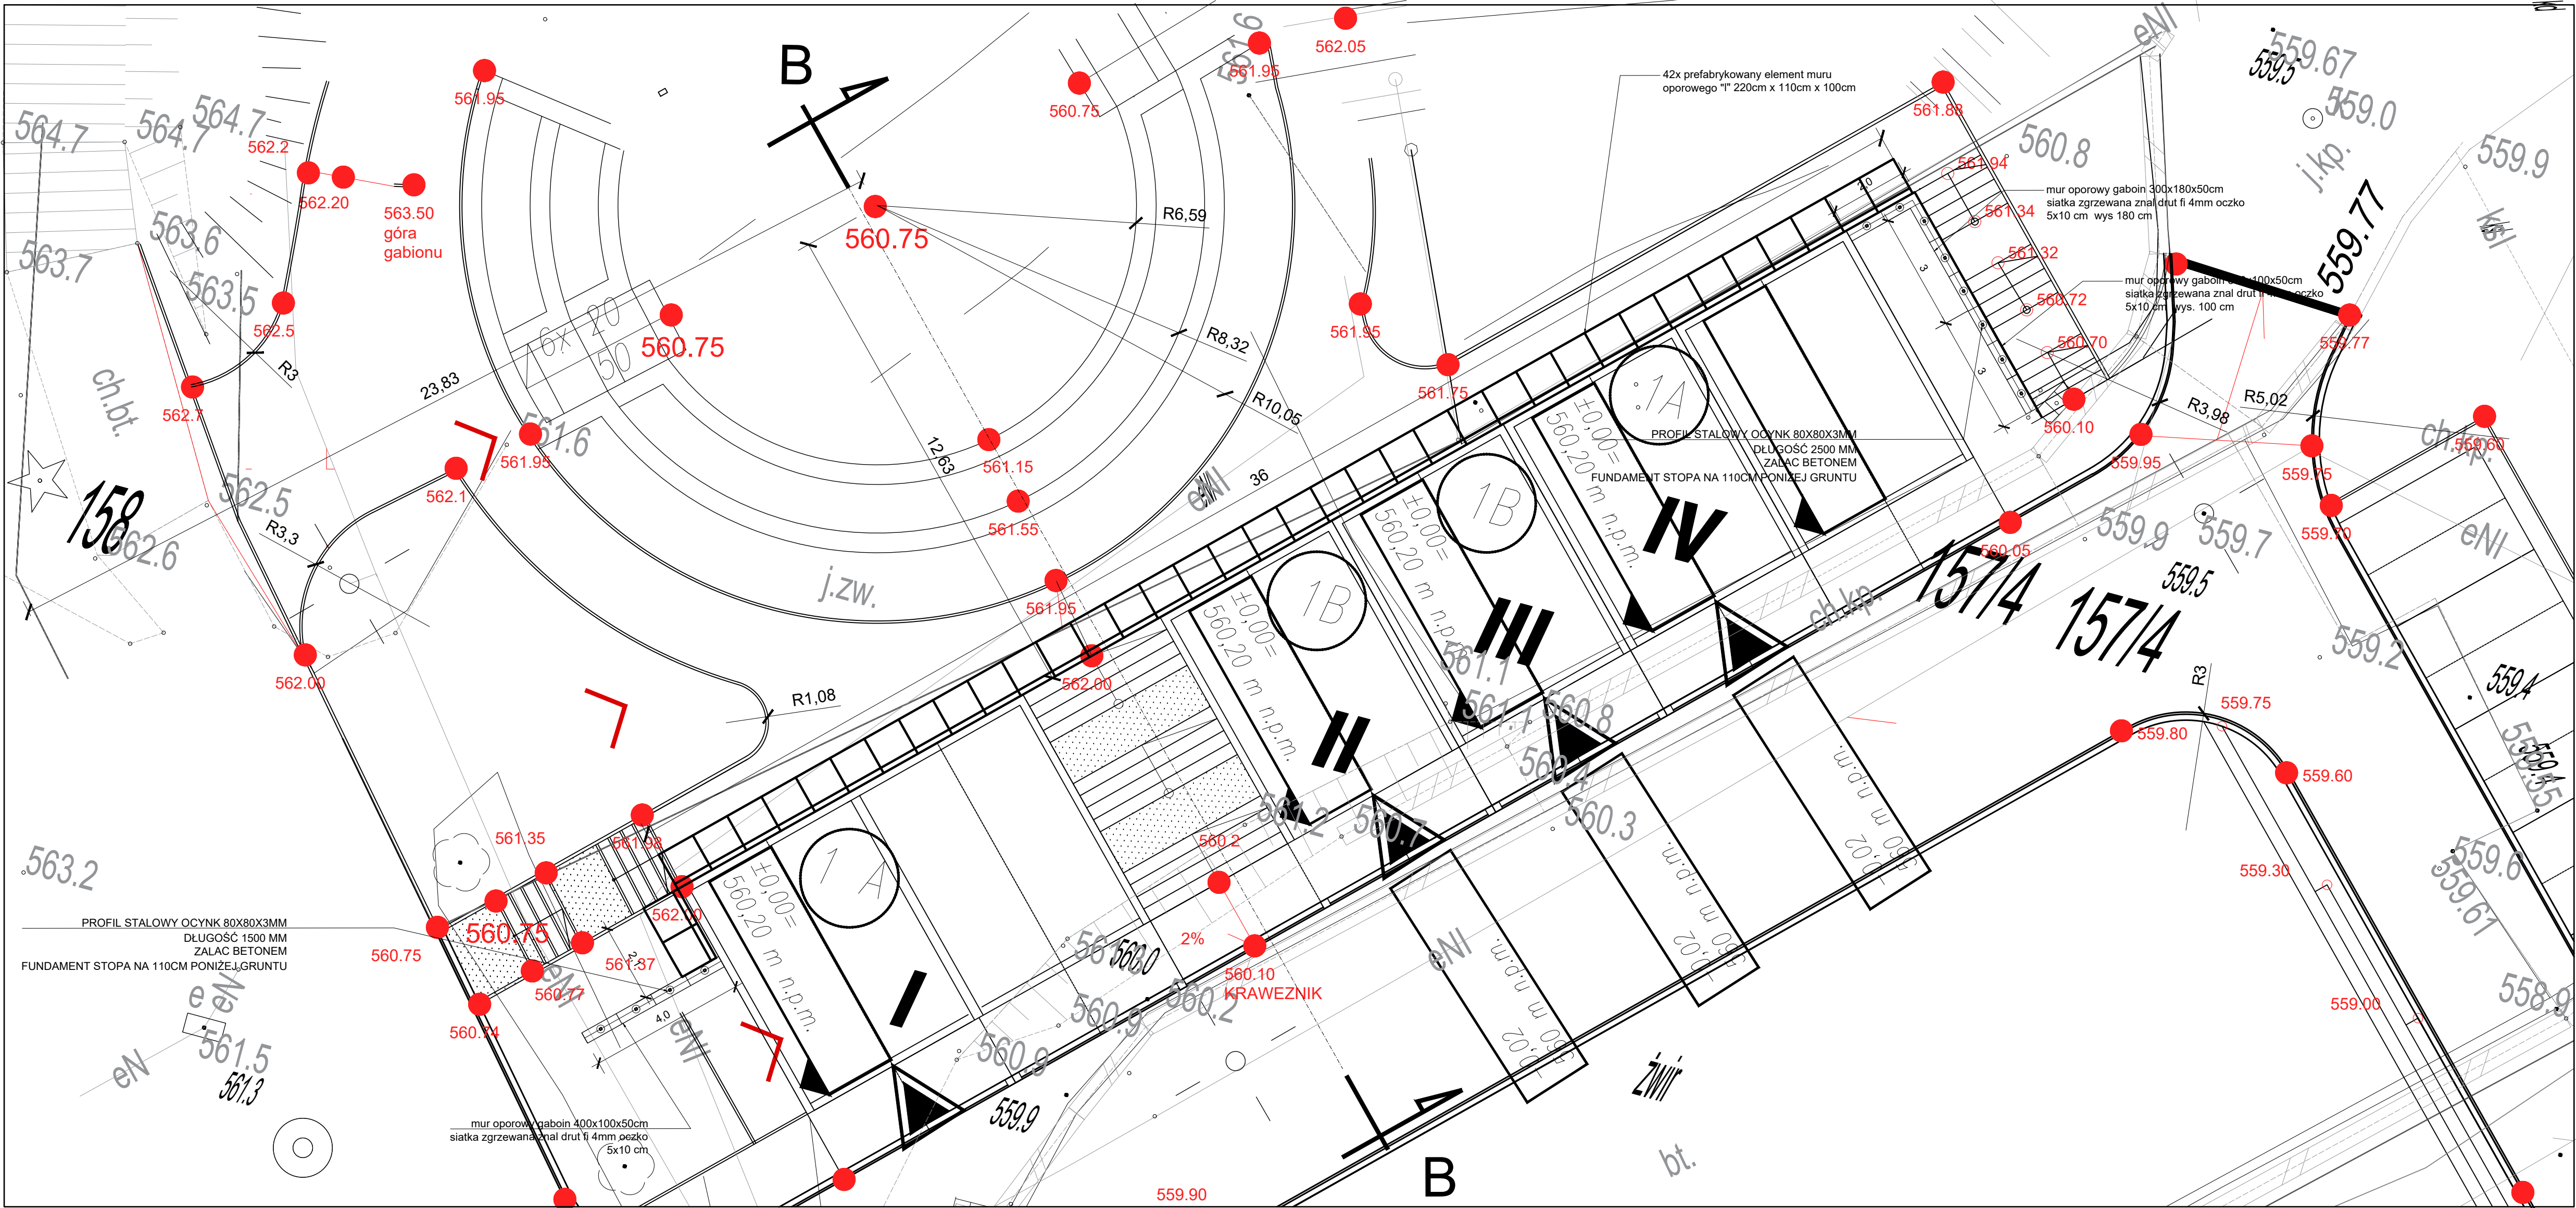


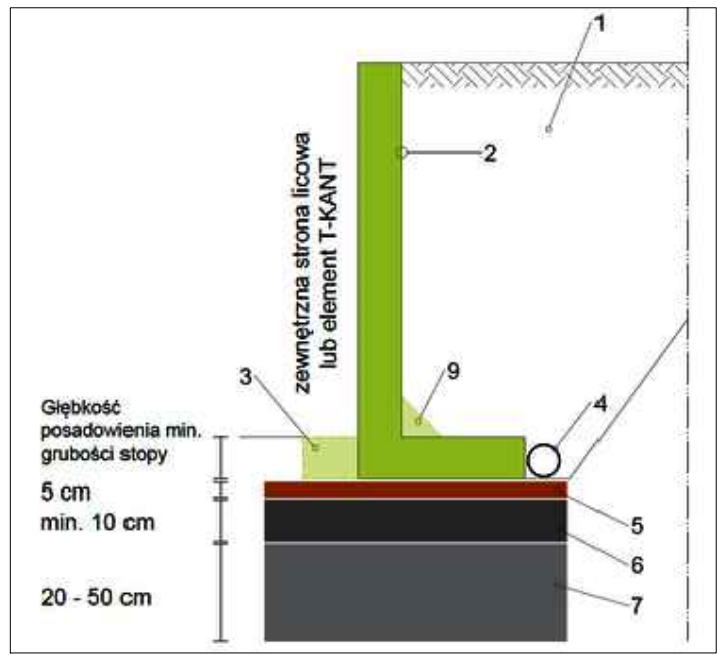

PRZEKRÓJ B-B

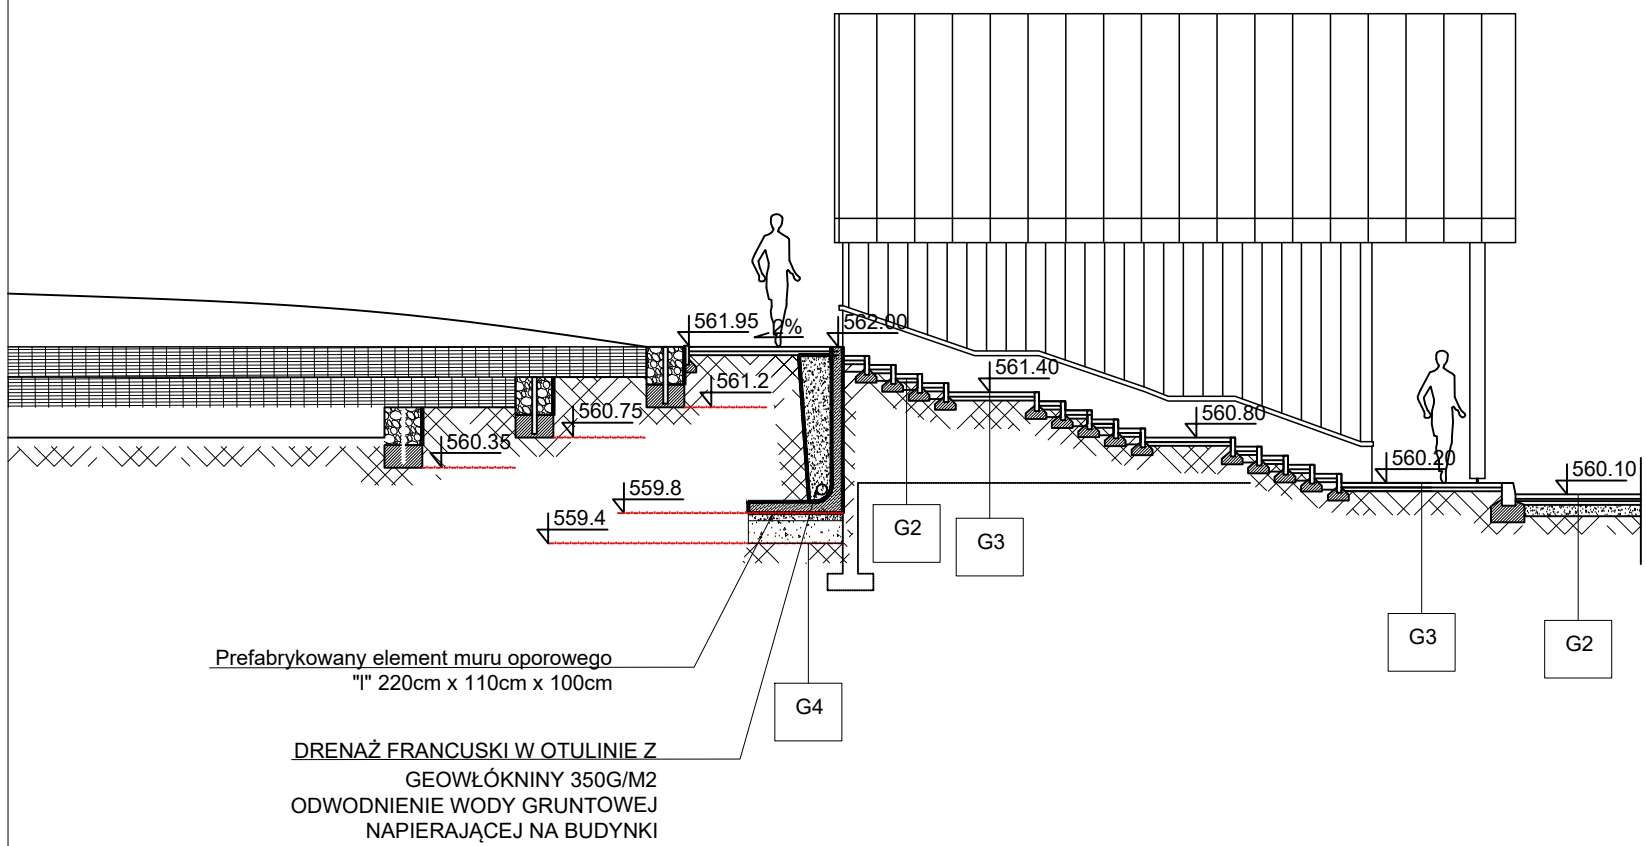

- 1. Zasyпка - grunt zasypowy (żwir, pospółka)
- 2. System transportu: standardowo uchwyty transportowe, alternatywnie: tuleje montażowe lub kotwy itd.
- 3. W razie konieczności z ostrogą (przeciwstopą)
- 4. Drenaż
- 5. Wilgotna wylewka jastrychowa
- 6. Beton min. C 16/20 (XC2) zalecenie: konstrukcyjnie zbrojony
- 7. Materiał mrozoodporny np. żwir, pospółka
- 8. Zbrojona podpora: konieczna przy elementach z wewnętrzną stroną licową! Zalecenie: połączyć konstrukcyjne z poz. 6
- 9. Istniejące wzmacnienie przy elementach z zewnętrzną stroną licową! nie dotyczy małych wysokości

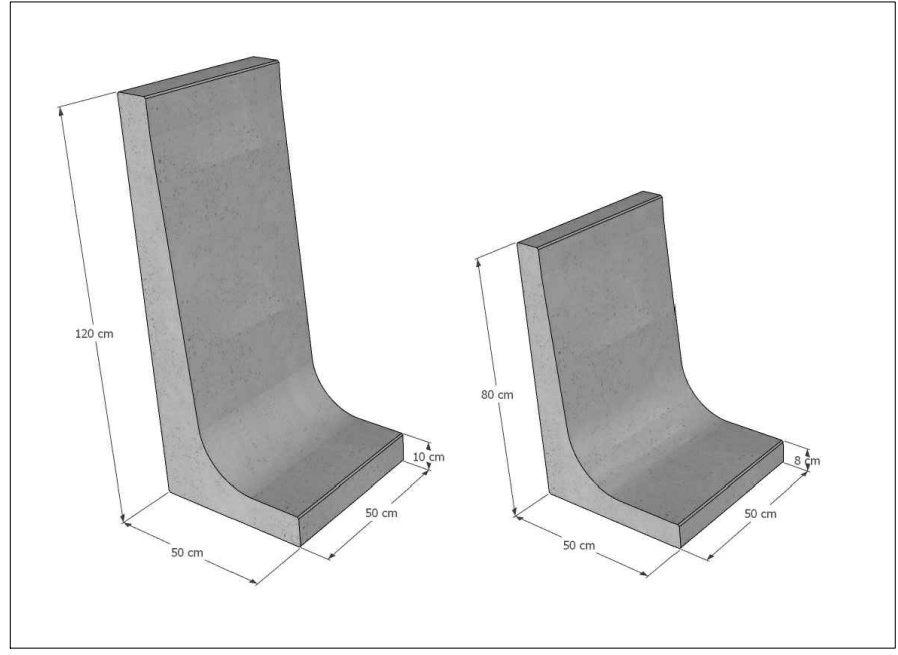

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW:
ELEMENTY PREFABRYKOWANE NP. COCNAN GROUP RADOM "L"
220X110X100 42 SZT.
KRUSZYWO ŁAMANE 16-32MM 14,25 M3
BETON C 16 4,75 M3
JASRTYCH WYLEWKA 2,35 M3

KOSZE GABIONOWE
KOSZE GABIONOWE 100x100x50cm 14 SZT
siatka zgrzewana żnal drut fi 4mm oczko 5x10 cm 1,59 M3
BETON C 16 2 M3
BETON NA FUNDOWANIE SŁUPÓW STALOWYCH 10SZT
PROFIL STALOWY OCYNK 80X80X3MM
ZALAĆ BETONEM
DŁUGOŚĆ 2500 MM
FUNDAMENT STOPA 130 PONIŻEJ GRUNTU

G1	1. ZIEMIA URODZAJNA MIESZANKA PRZEPUSZCZALNA; ziemia 50% torf odkwaszony 20% piasek 230%	15 CM
	2. GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY MECHANICZNIE	3 CM

G2	KOSTKA BETONOWA SZARA	6 CM
	2. PODSYPKA 0-5MM	3 CM
	3. KRUSZYWO ŁAMANE 16-32MM	15 CM
	4. GEOWŁÓKNINA 350G/M2	
	5. GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY	

G3	KRATA TTE Z NAWIERZCHNIA 6 CM KOSTKA BRUKOWA	6 CM
	2. KRUSZYWO 2-5mm	10 CM
	3. KRUSZYWO ŁAMANE 16-32MM	15 CM
	4. GEOWŁÓKNINA 350G/M2	
	5. GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY	

G4	Prefabrykowany element muru oporowego "T" 220cm x 110cm x 100cm	15 CM
	1. WYLEWKA JASTRYCH	5 CM
	2. BEON C16 ZBROJONY	10 CM
	3. KRUSZYWO ŁAMANE 16-32MM	30 CM
	4. GEOWŁÓKNINA 350G/M2	
	5. GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY MECHANICZNIE	
